



Det fynske EPJ-udbud

- erfaringer på vejen fra planlægning til gennemførelse

EPJ-observatoriets årskonference
27 og 28 oktober 2004 Nyborg Strand

EPJ-konsulent Henrik Lindholm, MI, Fyns Amt





Indhold

- Mål
- Bindinger og tid som styrende faktor
- Projektorganisation
- Kontrakten og udbud
- Udbudsprocessen



Hvor skal vi hen du??





Mål for EPJ i Fyns Amt

- Opfyldte aftalen med Regeringen
100% dækning pr 1.1.2006
- Sikre kvalitetsløft i amtet
- Anskaffe funktionalitet til:
 - Medicin
 - Notat
 - Rekvisition og Svar
 - System og integrationsplatform
 - Optioner – bl.a. booking



Væsentlige kriterier

- Understøttelse af klinikernes arbejdsprocesser, herunder:
 - Brugernes muligheder for at få overblik over **patientens situation**
 - Brugernes muligheder for at få overblik over **relevante arbejdsopgaver**
 - Brugernes muligheder for at få overblik over **afdelingsrelaterede arbejdsopgaver**




EPJ i Fyns Amt – bindinger

- Eksisterende system gennem mange år
 - Kan ikke skaleres til mere end 110 samtidige brugere
 - ...nyt skal anskaffes
- Regeringsaftalen
 - 100 % dækning inden udgangen af 2005
- Gældende lovgivning
- Gældende sundhedsinformatiske standarder




Vejen mod målopfyldelsen

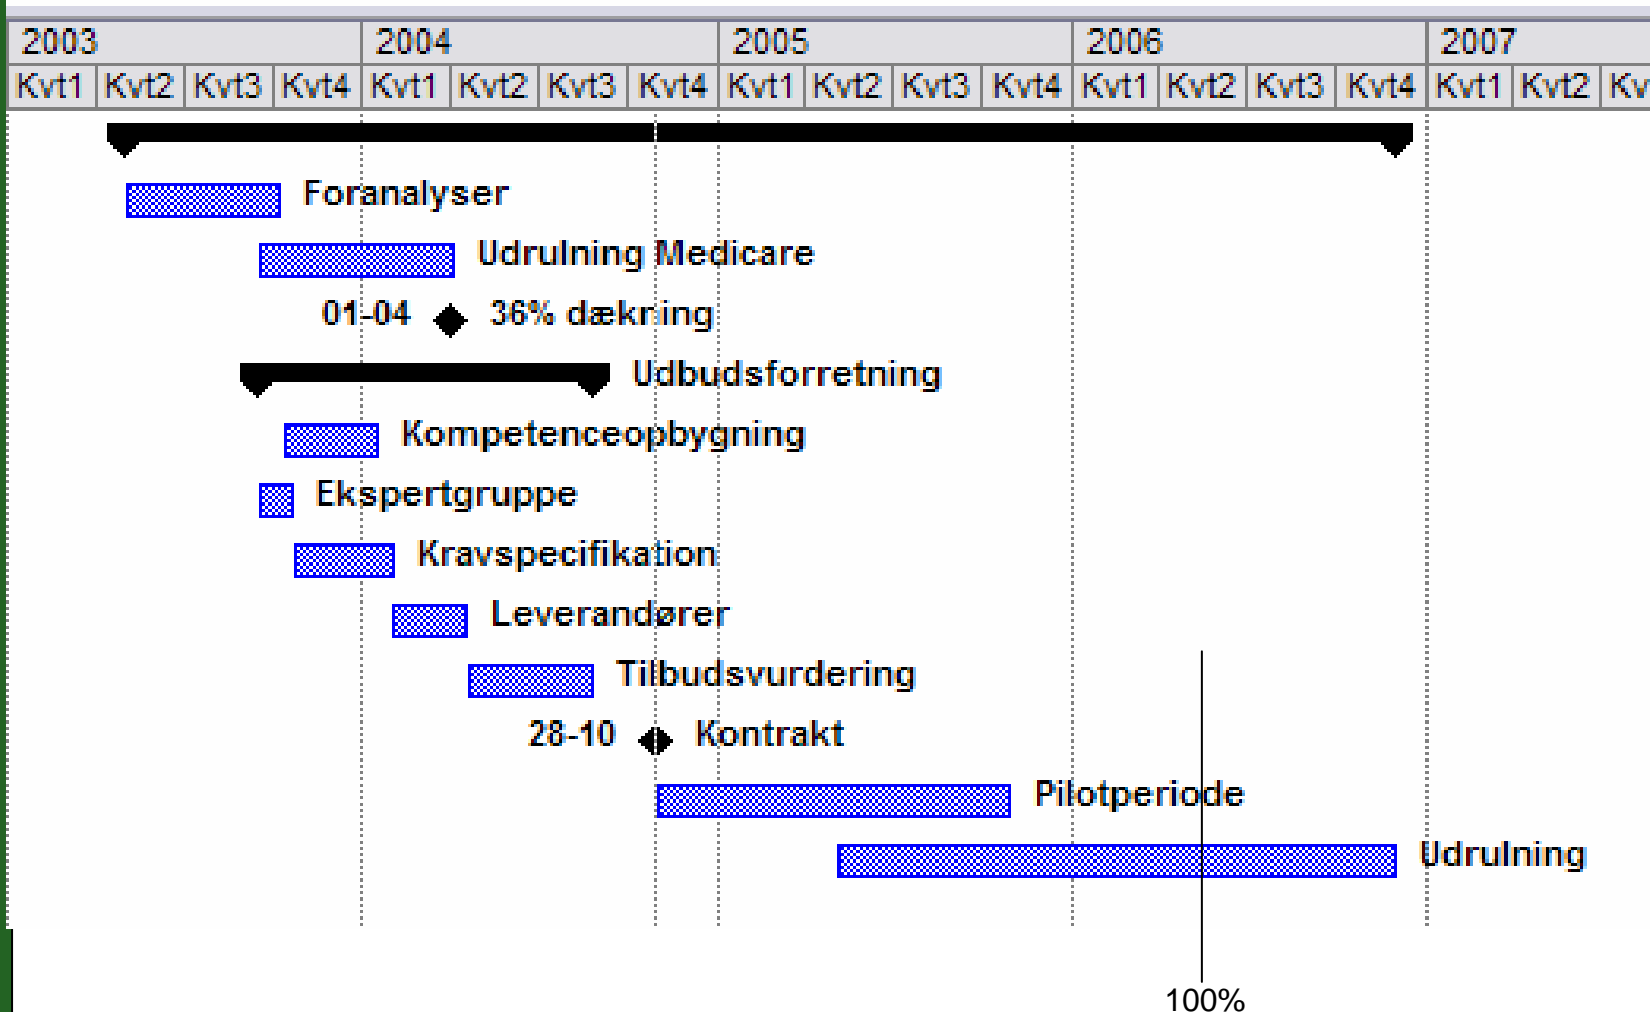



Projektorganisationen

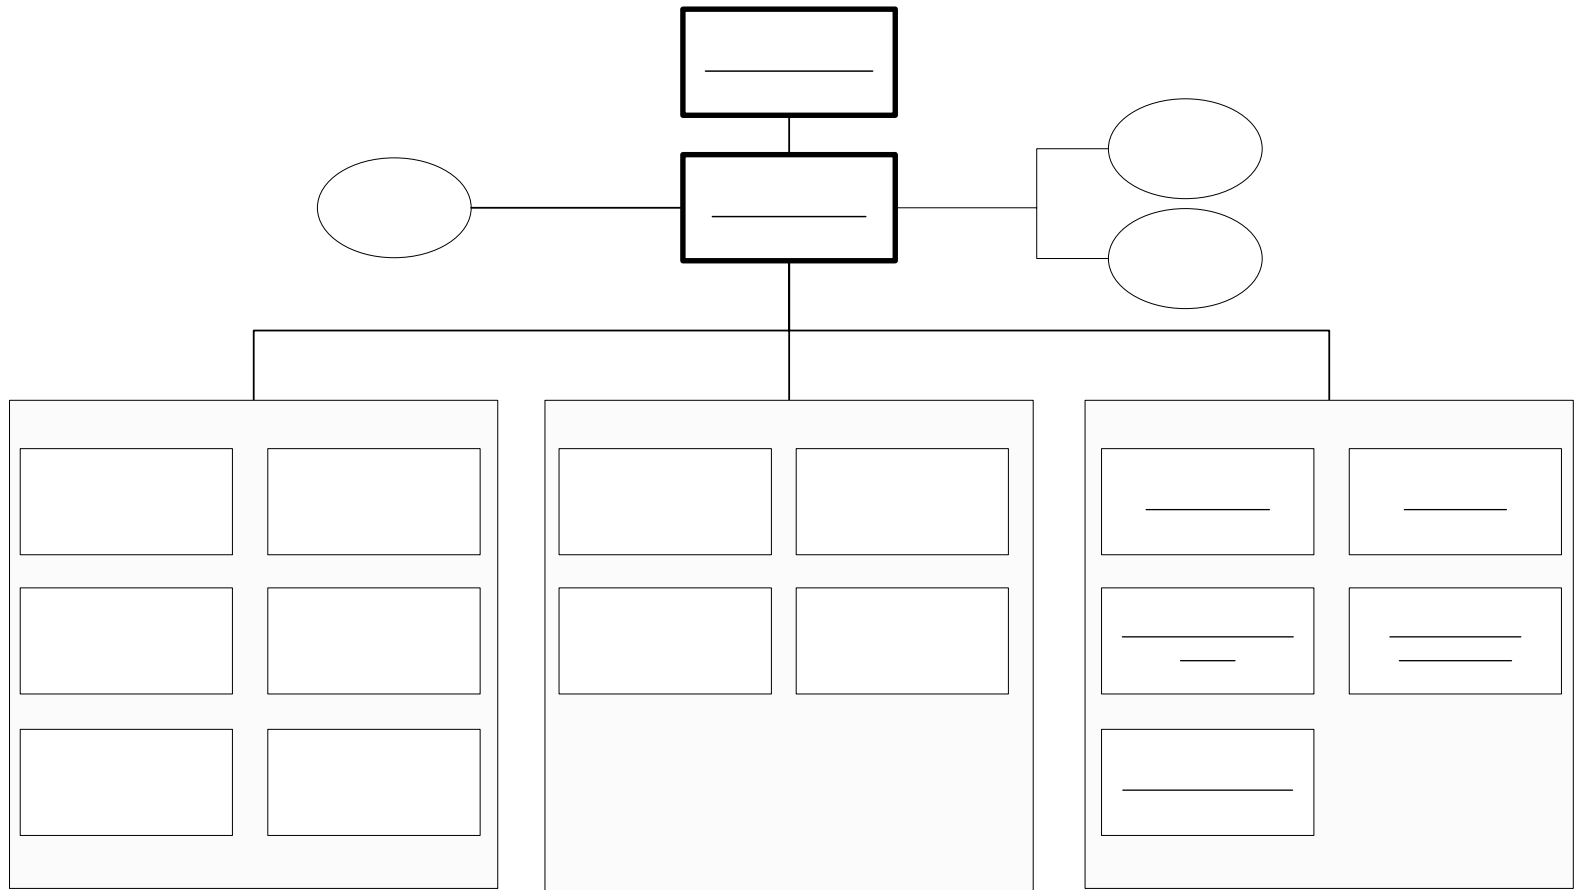



Kontrakt og udbud

- Fast pris kr.55 mio. frem til udgangen af 2009

- Færdig
Univer
2005

Fordele for Fyns Amt:

Forholdet til leverandøren:

- Styr på økonomi i perioden
- Leverandør konkurrerer på mængde af indhold

Forholdet til medarbejderne:

- Forventningsstyring

- Udru
pr. august 2005 (nu. 1.12.06)



Vilkår ved kontrakt

- Kun to minimumskrav
 - Gældende lovgivning
 - Sundhedsinformatiske standarder
- Kontrakt med to leverandører
 - Prøveopstilling
- Bekræftelse af den ene kontrakt
- Skrap regulering af overtagelsesprøver
 - Garantiprøve ved fuld drift
 - Fokus på evne til udrulning



Alle kendte danske leverandører

- Samtaler forsommeren 2003
- Forelagt og diskuteret vores planer
 - G-EPJ
 - Implementeringsstrategi og udrulningsplan
 - Håndtering af projektet
- Erfaringer høstet og anvendt




Kravspecifikationen

- Ny metode anvendt
- Viderebearbejdning af Usecase-metoden
- Formål med denne metode
 - Gennemføre kravspecifikation på kort tid
 - Undgå blokerende krav
 - Overlade løsningsbeskrivelser til leverandør



Kravspecifikationen

- Målbeskrivelser
- Arbejdsopgaver
- Datakrav
 - Ydelsesbeskrivelser
 - Notatbeskrivelser
 - Mm

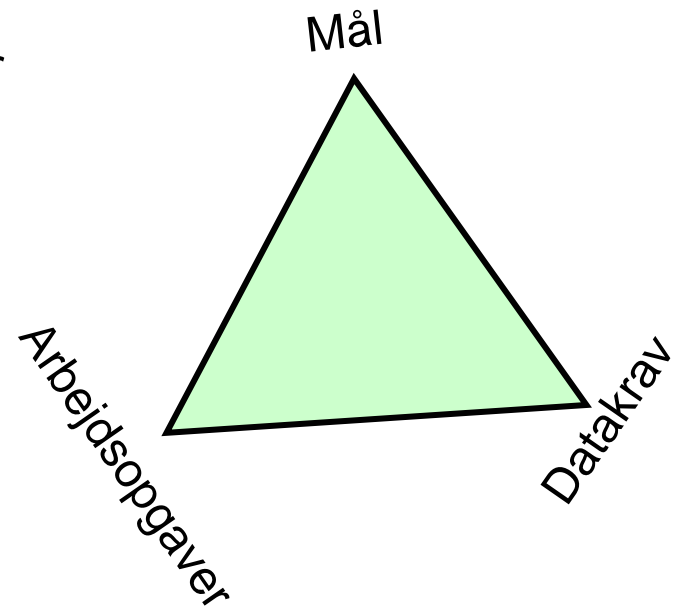



Vurderingsmetoden

- Proces understøttet elektronisk
 - Frigivelse udbudsmateriale via web
 - Aflevering af tilbud elektronisk
 - Metode understøttet via systemet
- 12 arbejdsgrupper har vurderet





Udfordringer

- G-EPJ
 - Ikke fastlagt på udbudstidspunkt
- Regeringsaftalen
 - Implementeringshastigheden
 - Forberedelse af organisation
 - EPJ-organisation
 - Driftsorganisation
- Region – så'en lige "pludselig"



**Se mere på
www.epj.dk**

